

**T.C.**  
**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**  
**2017 YILI YATIRIMLARI**



## YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 260 Proje
- 126.947.444 TL Ödenek

- 212 Proje Tamamlandı
- 69.285.657 TL Harcama

- %82 Proje Uygulaması
- %55 Harcama

# İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ ve UYGULAMALARI

## (31.12.2017 Tarihi İtibariyle)

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ				UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM ÖDENEK	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE	İHALE AŞAMASINDA PROJE	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	75	17.524.201	9.830.803	27.355.004	74	-	-	1	24.237.934	%99	%89
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD.	52	4.971.995	2.030.000	7.001.995	43	4	-	5	5.021.901	%83	%72
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	123	8.592.964	83.509.838	92.102.802	87	15	4	17	39.657.783	%71	%43
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	6	331.643	0	331.643	5	-	-	1	273.622	%83	%83
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	4	156.000	0	156.000	3	1	-	-	94.417	%75	%61
<b>İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI</b>	<b>260</b>	<b>31.576.803</b>	<b>95.370.641</b>	<b>126.947.444</b>	<b>212</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>69.285.657</b>	<b>%82</b>	<b>%55</b>



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ**

# YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	2	2	15	15	%100						Bitti.
2.ONARIM	19	19	88.2	88.2	%100						Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	27	27	110.2	110.2	%100						Bitti.
4.BSK	13	13	100	100	%100						Bitti.
5.SATHİ KAPLAMA	2	2	10.2	10.2	%100						Bitti.
6.II.KAT ASFALT	1	1	6	6	%100						Bitti.
7.METRİSTEPE ŞEHİTLİĞİ ASFALT	1						1.150.000	1.150.000			Başlamadı
8.BAKIM PROGRAMLARI											
GREYDERLİ BAKIM	1	1		685 Km							Bitti.
ASFALT BAKIM (YAMA)	1	1		470 Km							Bitti.
ASFALT YAMA ( Malzeme Alımı )	1	1				504.000		504.000	450.000	%89	Bitti.
ASFALT YAMA ( Hizmet Alımı )	1	1				350.000		350.000	344.558	%98	Bitti.
ASFALT YOL YAP.ve MAL.GİDERİ	1	1				14.027.056	7.576.538	21.603.594	19.354.978	%90	Bitti.
9.SANAT YAPILARI	1	1				100.000	20.000	120.000	104.773	%87	Bitti.
10.TRAFİK LEVHALARI	1	1				100.000		100.000	86.193	%86	Bitti.
11.İŞ MAKİNALARI ALIM	2	2				2.378.145	1.084.265	3.462.410	3.832.432	%100	1 Ad.Dozer, 1Ad.Ekskavatör, 1Ad.Kanal Kazıcı, 1 Ad.Yükleyici, 2 Ad.Binek Araç, 2 Adet Mercedes Kamyon, 2 Adet Toyoto Arazi, 1 Adet Ford Minibüs
12.DURŞUN FAKİH TÜRBEŞİ İSTİNAT DUVARI	1	1				65.000		65.000	65.000	%100	Bitti.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>75</b>	<b>74</b>				<b>17.524.201</b>	<b>9.830.803</b>	<b>27.355.004</b>	<b>24.237.934</b>	<b>%89</b>	

# Küçükemalı - Güde Köy Yolu



# Bozcaarmut Köy Yolu



# Bozcaarmut Köy Yolu





# Selöz - Ulupınar Köy Yolu



# Selöz - Ulupınar Köy Yolu



# Kandilli – İnönü Köy Yolu



# Cihangazi - Karaçayır - Osmaniye - Gökçeli Köy Yolu



# Deresakarı K y Yolu



# Deresakarı Köy Yolu



# T.C.K. – Küre Köy Yolu



# Küre – Kurtköy Yolu (Osib Mevkii)







**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**SU ve KANAL HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ**

# SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## İCMALİ

İşin Adı	Program (Proje Ad.)	Uygulama (Proje Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Maddi (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
<b>1.İÇMESUYU PROJELERİ</b>	30	26	%87	3.585.000	778.000	<b>4.363.000</b>	1.752.517	778.000	<b>2.530.517</b>	%58
<b>2.KANALİZASYON PROJELERİ</b>	13	10	%77	421.000	1.252.000	<b>1.673.000</b>	405.937	1.252.000	<b>1.657.937</b>	%99
<b>3.SULAMA PROJELERİ</b>	3	3	%100	583.360	0	<b>583.360</b>	500.652	0	<b>500.652</b>	%86
<b>4.DİĞER TARIM PROJELERİ</b>	6	4	%67	382.635	0	<b>382.635</b>	332.795	0	<b>332.795</b>	%87
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>%83</b>	<b>4.971.995</b>	<b>2.030.000</b>	<b>7.001.995</b>	<b>2.991.901</b>	<b>2.030.000</b>	<b>5.021.901</b>	<b>%72</b>

# İÇMESUYU PROJELERİ

İşin Adı	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			HARCA MA (TL)	Mad di (%)	AÇIKLAMALAR
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM			
<b>1.YENİ İHALELİ İŞLER</b>	17	14	%82	529.684	778.000	<b>1.307.684</b>	1.307.684	%100	<b>Merkez-Kuyubaşı,Kepirler,Ayvacık, Bozüyük-Saraycık ,Osmaniye,Karaçayır, Hamidiye, İnhisar-Akköy, Osmaneli-Akçapınar-Gaziler Mah. Pazaryeri-Burçalık, Bulduk, Dülgeroğlu Yenipazar-Nasuhlar Danışmant Grubu,Doğubelenören Köyleri bitti.</b> Osmaneli-Sarıyazı-Benli dev.ediyor. Merkez-Künçeğiz, İnhisar-Tozman ödenekleri KHGB'ye Aktarıldı.
<b>2.İÇMESUYU BAKIM ONARIM</b>	1	1	%100	1.835.316	0	<b>1.835.316</b>	244.425	%13	51 Köyde Devlet-Vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak içmesuyu tesislerinin bakım onarımları ile 7 köyde klorldama binası ve bakımları yapıldı.
<b>3.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI</b>	1	1	%100	50.000	0	<b>50.000</b>	17.127	%34	İhtiyacı olan köylere dağıtımlar tamamlandı.
<b>4.OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI ALIM BAKIM ve ONARIM</b>	1	1	%100	500.000	0	<b>500.000</b>	306.281	%61	50 Köye Klorldama Cihazı Alımı gerçekleştirilmiş olup, montajları tamamlandı.
<b>5.KONTROL ve DENETİM İZLEMELERİN ANALİZ FATURALARI</b>	1	1	%100	30.000		<b>30.000</b>	15.000	%50	Bitti.
<b>6.YENİ SONDAJ İŞLERİ</b>	9	8	%89	640.000		<b>640.000</b>	640.000	%100	Bozüyük-Kızıltepe, Gölpazarı-Üyük, Köprücek, Dereli, İncirli-Bostancılar Mh, Sarıhacılar-Cansızlar Mh,Kümbet, Osmaneli-Sarıyazı-Benli, Mh. Bitti.Gölpazarı-Kuşçaören Devam Ediyor.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>%87</b>	<b>3.585.000</b>	<b>778.000</b>	<b>4.363.000</b>	<b>2.530.517</b>	<b>%58</b>	

## MERKEZ KUYUBAŐI DEPO ONARIMI



## MERKEZ KEPİRLER DEPO ONARIMI



## BOZÜYÜK KARAÇAYIR DEPO ONARIMI



## BOZÜYÜK SARAYCIK DEPO ONARIMI



## GÖLPAZARI SARIHACILAR 10 m3 LÜK YENİ DEPO YAPIMI



## GÖLPAZARI ÇİMİŞKI-BAHÇELİEVLER DEPO ONARIMI



## PAZARYERİ DÜLGEROĞLU DEPO ONARIMI



## YENİPAZAR DOĞUBELENÖREN DEPO ONARIMI



## OSMANELİ SARIYAZI-BENLİ MAH. SONDAŞ İŞİ



## GÖLPAZARI İNCİRLİ-BOSTANCILAR MAH. SONDAJ İŞİ





# İÇMESULARI BAKIM ONARIM (KLORLAMA BİNALARI) İŞLERİ



# İÇMESULARI BAKIM ONARIM (DRENAJ) İŞLERİ



# İÇMESULARI BAKIM ONARIM (İSALE-ŞEBEKE HATLARI) İŞLERİ




# İÇMESULARI BAKIM ONARIM (İSALE-ŞEBEKE HATLARI) İŞLERİ




# KANALİZASYON PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.KANALİZASYON İŞLERİ	9	6	%67	121.000	1.252.000	1.373.000	1.372.000	%100	Bozüyük-Aşağıarmutlu,Dombayçayırı, Yeşilçukurca , Gölpazarı-Tongurlar , Gölpazarı-Tongurlar-Urgancılar , Gölpazarı-Aktaş-Beşevler bitti. Söğüt-Zemzemiye-Yenimahalle dev.ed. Söğüt-Küre ,İnhisar-Tozman KHGB'liğine Aktarıldı.
2.FOSSEPTİK YAPIMI	2	2	%100	50.000	0	50.000	50.000	%100	Merkez-Kızıldamlar, Söğüt-Zemzemiye- Yenimahalle bitti.
3.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ	1	1	%100	250.000	0	250.000	235.937	%94	45 Köyde Devlet-Vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak kanalizasyon hatlarının bakım onarimleri yapıldı.
4.DOĞAL ARITMA	1	1	%100	0	0	0	0		Söğüt-Zemzemiye Yenimahalle Bitti.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>%77</b>	<b>421.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.657.937</b>	<b>%99</b>	

# BOZÜYÜK DOMBAYÇAYIRI KANALİZASYON BİTTİ

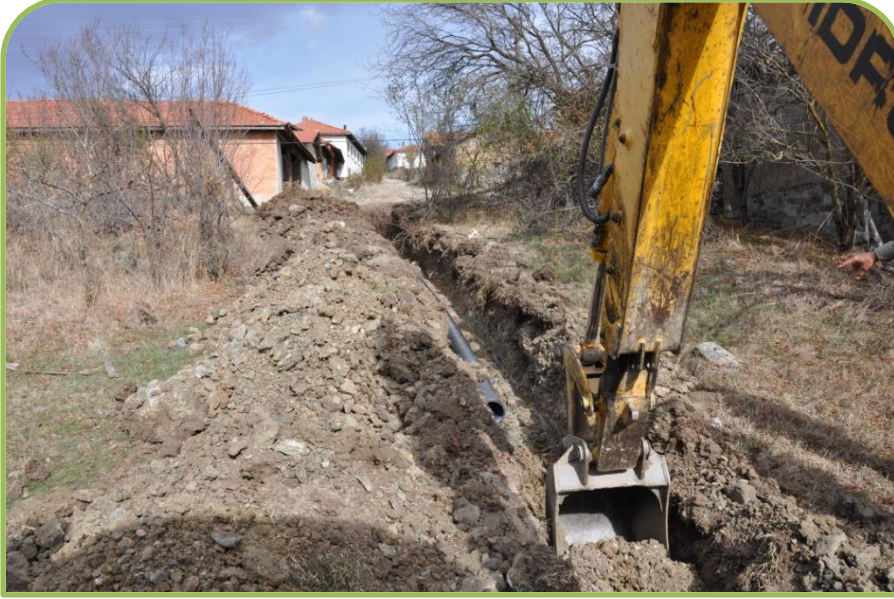

# BOZÜYÜK YESİLÇUKURCA KANALİZASYON BİTTİ.

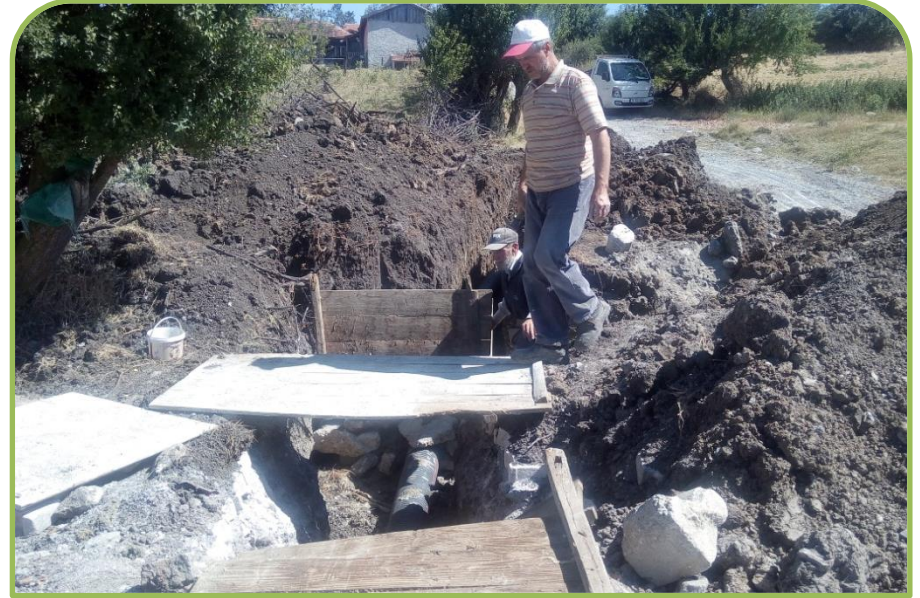

# GÖLPAZARI-AKTAŞ BEŞEVLER MAH. KANALİZASYON BİTTİ





# GÖLPAZARI-TONGURLAR KANALİZASYON BİTTİ



# SÖĞÜT-ZEMZEMİYE-YENİMAHALLE KANALİZASYON



# SÖĞÜT-ZEMZEMİYE-YENİMAHALLE DOĞAL ARITMA



# SÖĞÜT-ZEMZEMİYE-YENİMAHALLE FOSSEPTİK



# MERKEZ-KIZILDAMLAR FOSSEPTİK



# SULAMA PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCA MA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.TARIMSAL ENH PRJ.	2	2	%100	433.360	0	433.360	433.360	%100	1.İnhisar-Koyunlu bitti. 2.Osmaneli-Selimiye bitti.
2.SULAMA TESİSLERİ BAKIM ONARIM	1	1	%100	150.000	0	150.000	67.292	%45	Bitti.
GENEL TOPLAM	3	3	%100	583.360	0	583.360	500.652	%86	

# OSMANELİ-SELİMİYE TARIMSAL ENH (Bitti)



# İNHİSAR - KOYUNLU TARIMSAL ENH (Bitti.)





# DİĞER TARIM PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
<b>1.Yem Bitkileri Tohumu Alım Projesi</b>	1	1	%100	150.000		<b>150.000</b>	150.000	%100	Yonca Tohumluğu ve Macar fiği alımı yapılarak 82 köyde 470 çiftçiye dağıtımı yapılmıştır.
<b>2.Tarım Makineleri Alım Projesi</b>	1	1	%100	100.000		<b>100.000</b>	100.000	%100	Gölpazarı-Kavak ve Bolatlı Köylerine süt soğ.tankı alımı yapıldı.
<b>3.Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı</b>	1		%0	9.840		<b>9.840</b>			
<b>4.Tahagel Payı</b>	1	1	%100	32.795		<b>32.795</b>	32.795	%100	TAHAGEL'e aktarıldı.
<b>5.Pazaryeri Günyurdu Yağmursuyu Deşarj Yapımı</b>	1	1	%100	50.000		<b>50.000</b>	50.000	%100	<b>Bitti.</b>
<b>6.Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi</b>	1		%0	40.000		<b>40.000</b>			
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>%67</b>	<b>382.635</b>		<b>382.635</b>	<b>332.795</b>	<b>%87</b>	

# PAZARYERİ GÜNYURDU YAĞMUR SUYU DEŞARJ KANAL İNŞAATI





**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**PLAN PROJE YATIRIM VE  
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

# PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

## İCMALİ

İşin Adı	Program (Ad.)	Uygulama (Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Mad di (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.EĞİTİM HİZMETLERİ	76	53	%70	7.925.952	57.602.646	65.528.598	2.046.139	23.983.706	26.029.845	%40
2.SAĞLIK HİZMETLERİ	20	14	%70	0	4.193.071	4.193.071	0	2.238.566	2.238.566	%53
3.GÜVENLİK HİZMETLERİ	16	12	%75	0	15.253.897	15.253.897	0	9.149.253	9.149.253	%60
4.TESİS BAKIM ONARIM	4	4	%100	657.012	94.164	751.176	657.012	85.229	742.241	%99
5.KÜLTÜR VE TURİZM	6	3	%50	0	6.366.060	6.366.060	0	1.487.878	1.487.878	%23
6.SOSYAL HİZMETLER	1	1	%100	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	%100
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>123</b>	<b>87</b>	<b>%71</b>	<b>8.592.964</b>	<b>83.509.838</b>	<b>92.102.802</b>	<b>2.713.151</b>	<b>36.944.632</b>	<b>39.657.783</b>	<b>%43</b>

# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1-25	İlköğretim Kurumları Onarım Prj.			4.673.553	1.923.453	100%	25 İş Bitti.
26-41	Ortaöğretim Kurumları Onarım Prj.			1.710.056	1.705.830	100%	16 İş Bitti.
42-49	Okul Binaları Güçlendirme İşleri			3.825.000	3.785.151	75%	6 İş Bitti.2 İş dev.ed.
50	Bahçelievler Mevkii 16 Derslik Ortaokul Yapım İşi	3.958.585	2.966.439	748.201	748.201	100%	Bitti.
51	Bozüyük 24 Derslik Anad.İmam.Htp.Lis.Yapım.İşi	5.136.616	4.666.157	547.228	547.228	100%	Bitti.
52	Bozüyük Fen Lisesi 80 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Bin.Yap.İşi	3.458.788	1.490.528	1.546.091	1.546.091	100%	Bitti.
53	BilecikMesleki ve Tek.Anadolu LisesiKapalı Spor Salonu Yap.İşi	1.450.751	807.705	528.055	528.055	100%	Bitti.
54	Osmaneli İlçesi 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	4.980.681	2.974.443	1.522.537	1.522.537	100%	Bitti.
55	Merkez Okul Arsa Kamulaştırma (İstiklal Mh)			1.207.952	1.207.952	100%	Kamulaştırma Bed.Yatırıldı.
56	Merkez Anadolu İmam Hatip Lis. 100 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Bin.Yap.İşi	3.176.000	453.945	3.293.735	3.018.377	98%	Devam Ediyor.
57	Gölpazarı 21 derslikli İmam Hatip Lisesi ve100 öğrencili pansiyon binası tatbikat Camii ve çevre düz.İşi	10.616.221		9.667.740	1.574.383	25%	Devam Ediyor.
	<b>TOPLAM</b>	<b>32.777.642</b>	<b>13.359.217</b>	<b>29.270.148</b>	<b>18.107.258</b>		

# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
	<b>NAKLİ YEKÜN</b>	<b>32.777.642</b>	<b>13.359.217</b>	<b>29.270.148</b>	<b>18.107.258</b>		
58	Pazaryeri 16 Derslik Sağlık Mes.Lis. ve 200 Öğrencilik Pan.Bin.	6.804.616		6.176.120	2.287.638	65%	Devam Ediyor.
59	Osmaneli 22 Derslikli Ç.P.L. Atölye Bin.ile Gen.Altyapı ve Çevre Düz.İşiYap.	6.961.484		6.360.200	2.988.415	55%	Devam Ediyor.
60	Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 21 Derslikli Bina Yap.	4.211.698		3.479.820	472.855	45%	Devam Ediyor.
61	Söğüt 100 öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	5.078.802		4.262.160	1.279.030	50%	Devam Ediyor.
62	Osmaneli 100 öğrenci kapasiteli Orta Öğretim Pansiyon Binası	4.923.074		4.386.650	894.649	30%	Devam Ediyor.
63	Bozüyük 24 Derslikli Mesleki Tek.Anadolu Lisesi	6.675.342		6.360.200			Sözleşmesi ve yer teslimi yapılmıştır.
64	Osmaneli 24 Derslik Balaban İlkokulu	5.648.368		5.233.300			18.12.2017 tarihinde yer teslimi yapıldı. Parsel üzerinde bulunan binalar yıkılmaktadır.
65	Merkez 20 Derslikli Hayme Ana Meslek ve Tek.Lis.						Yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.
66	Gölpazarı 20 Derslikli Şehit Kemal AY Anadolu Lis.						28.12.2017 tarihinde ihalesi yapıldı. Tekrar ihaleye çıkılacak.
67	Pazaryeri 16 Derslikli Meslek ve Teknik Lise Yapımı						Avan projeler Milli Eğit. Bakan'na gönderilmiştir. İl Milli Eğt.Md.den cevap beklenmektedir.
	<b>TOPLAM</b>	<b>73.081.026</b>	<b>13.359.217</b>	<b>65.528.598</b>	<b>26.029.845</b>		

# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
	<b>NAKLİ YEKÜN</b>	<b>73.081.026</b>	<b>13.359.217</b>	<b>65.528.598</b>	<b>26.029.845</b>		
68	Merkez Ertuğrulgazi Lis.100 Öğrenci kapasiteli Pansiyon Binası yapım işi						Ocak 2018 de ihaleye çıkılabilecektir.
69	Merkez Kız İmam Hatip Lis.Kapalı Spor Salonu Yap.						Milli Eğitim Müdürlüğünce proje bekletilmektedir.
70	Merkez Öğretmen evi Güçlendirme Yapılması İşİ						Milli Eğitim Müdürlüğünce proje bekletilmektedir.
71	Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası 24 Derslikli Bina ve 3 Atölye Bin.						Milli Eğitim Müdürlüğünce projenin uygulaması bekletilmektedir.
72	Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu						Mevcut spor salonunun yıkımına başlandı. Yeni tip salonunun proje revize ihalesine çıkılacaktır.
73	Bilecik Bozüyük 8 Derslikli Anaokulu Yapılması İşİ						Avan Projeler Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
74	Bilecik Merkez Anaokulu Yapım İşİ						Proje revize ihalesi yapılmıştır. Sözleşme sürecindedir.
75	Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yapım İşİ						İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ihalesi yapılacaktır.
76	Bilecik Merkez Kız İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşİ						Avan projeler Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmiştir. Proje revize edilecektir.
<b>76</b>	<b>EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>73.081.026</b>	<b>13.359.217</b>	<b>65.528.598</b>	<b>26.029.845</b>		

# Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapım İŖi.

İhale Bedeli	: 1.132.000,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Mehmet KIZIL
Sözleşme Tarihi	: 07.04.2016
Yer Teslim Tarihi	: 11.04.2016
İŖin süresi	: 400 gün
İŖin bitiş tarihi	: 15.05.2017
Fiziki gerçekteşme	: %100
Mevcut Durum	: Bitti





# Bozüyük Fen Lisesi 80 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 2.527.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Bilser Mim Hafriyat  
Turizm Yapı İnş. Ve Tic.Ltd.Şti.  
Sözleşme Tarihi : 27.05.2016  
Yer Teslim Tarihi : 01.06.2016  
İşin süresi : 400 gün  
İşin bitiş tarihi : 04.07.2017  
Fiziki gerçekleşme : % 100  
Mevcut Durum : Bitti.



# Bilecik Osmaneli İlçesi 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi

İhale Bedeli	: 3.783.000,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Rasim Kaya
Sözleşme Tarihi	: 18.03.2016
Yer Teslim Tarihi	: 22.03.2016
İşin süresi	: 500 gün
İşin bitiş tarihi	: 31.07.2017
Fiziki gerçekleşme	: %100
Mevcut Durum	: Bitti.



# Bilecik Bozüyük 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Hizmet Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 4.865.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Hasan Fecri AKAGÜNDÜZ  
Sözleşme Tarihi : 04.03.2015  
Yer Teslim Tarihi : 09.03.2015  
İşin süresi : 510 gün  
İşin bitiş tarihi : 04.11.2017  
Fiziki gerçekleşme : %99  
Mevcut Durum : İş Tasviye Edildi.Yüklenici namı hesabına iş Bitti.



T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI  
BİLECİK BOZÜYÜK İLÇESİ 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ

ARKA CEPHE PERSPEKTİFİ



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

YÜKLENİCİ FIRMA: KAFAN PROJE



# Bilecik Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 3.176.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Uğural Elektrik Aydınlatma İnş.San.Tic.Ltd.Şti.  
Sözleşme Tarihi : 15.08.2016  
Yer Teslim Tarihi : 18.08.2016  
İşin süresi : 360 gün+45 gün  
İşin bitiş tarihi : 13.02.2018  
Fiziki gerçekleşme : %98  
Mevcut Durum : Devam ediyor.



# Osmaneli 22 Ders.Ç.P.L., Atölye Binası ile Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

İhale Bedeli : 5.390.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Hazantem Tem.İnş.Gıda  
Otomosyon Taah.San.Tic.Ltd.Şti.  
Sözleşme Tarihi : 20.01.2017  
Yer Teslim Tarihi : 24.01.2017  
İşin süresi : 500 gün  
İşin bitiş tarihi : 08.06.2018  
Fiziki gerçekleşme : %55  
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



# Bilecik Osmaneli 100 öğrenci Kapasiteli Orta Öğretim Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 3.717.500,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Cihat AKTUNA-AKM Yapı  
Dek. İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortak.  
Sözleşme Tarihi : 01.05.2017  
Yer Teslim Tarihi : 08.05.2017  
İşin süresi : 450+59 gün  
İşin bitiş tarihi :29.09.2018  
Fiziki gerçekleşme : % 30  
Mevcut Durum :Devam Ediyor.



# Bilecik Söğüt 100 öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

İhale Bedeli	: 3.612.000,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Ali Enver BAĞAN
Sözleşme Tarihi	:24.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 29.05.2017
İşin süresi	: 450 gün
İşin bitiş tarihi	:21.08.2018
Fiziki gerçekleştirme	: %50
Mevcut Durum	:Devam Ediyor.



# Bilecik Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 21 Ek Derslik Binası Yapımı İşi

İhale Bedeli : 2.949.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Oraka İnş.Taah.Gıda San.ve  
Tic.Ltd.Şti.  
Sözleşme Tarihi : 30.06.2017  
Yer Teslim Tarihi : 05.07.2017  
İşin süresi : 450 gün  
İşin bitiş tarihi :27.09.2018  
Fiziki gerçekleşme : %45  
Mevcut Durum : Devam Ediyor.





# Pazaryeri 16 Ders.Sağlık Mes.Lis. Ve 200 Öğr.Kapasiteli Pans.Bin.ve Çevre Düz. Yap.İşi

İhale Bedeli	: 5.234.000,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Ak Him Yapı Müh.Turz. Gıda Yat.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Tarihi	: 09.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 13.03.2017
İşin süresi	: 450 gün
İşin bitiş tarihi	:05.06.2018
Fiziki gerçekleşme	: %65
Mevcut Durum	: Devam Ediyor.



# Bilecik Gölpaazarı 21 Ders.İmam Hatip Lis. 100 Öğr.Pans.Bin., Tatbikat Camii ve Çevre Düz.İşi.

İhale Bedeli : 8.193.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma: Mehmet Salih  
ÇELİK/Mehmet AYTAŞ İş Ortaklığı.  
Sözleşme Tarihi : 20.06.2017  
Yer Teslim Tarihi : 23.06.2017  
İşin süresi : 700 gün  
İşin bitiş tarihi :24.05.2019  
Fiziki gerçekleşme : %25  
Mevcut Durum :Devam Ediyor.



# SAĞLIK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Söğüt 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	1.801.860	1.801.860	1.598.364	100%	Bitti.(Kabul Aş.)
2-14	Halk Sağlığı Büyük Onarımları	650.000	641.211	640.202	100%	13 iş bitti.
15	Bozüyük Palyotif TRSM+Diş Protez Merk.Yapımı		1.500.000			Proje Bilgileri Bekleniyor.
16	Bözüyük 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi		85.000			Proje Revize işlerine başlandı.Zemin Etüdüleri yapıldı.Mimari avan proje revizeleri yapılmaktadır.
17	Osmaneli 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi		85.000			Proje Bilgileri Bekleniyor.
18	Yenipazar Entegre Has. Ek Bina işi		80.000			Proje Bilgileri Bekleniyor.
19	Merkez 2 Hek.ASM+TSM Bina yap.İşi					Sağlık Müdürlüğünden Yatırım Arsa bilgisi, Uygulanacak Proje v.b. Bilgiler gönderilmediği için çalışmalara başlanamadı
20	Dodurga Aile Sağlığı Merkezi					Ödenek Yok
	Cihangazi Sağlık Evi Yapım İşİ					Ödenek Yok
	Gülümbe Sağlık Evi Yapım İşİ					Ödenek Yok
	Osmaneli Merkez TSM Bin.Yap.İşi					Ödenek Yok
	İl Sağ. Müd. İl Halk Sağı. Md. Ve Genel Sekrt. Bin. Yapım İşİ					Ödenek Yok
	Sağılık Eğitim ve Seminer Merk.Yap.İşi					Ödenek Yok
	KETEM Merkezi Hizmet Bin.Yap.İşi					Ödenek Yok
	Yenipazar Yeni İlçe Dev.Has.Yap.İşi					Ödenek Yok
<b>20</b>	<b>SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.451.860</b>	<b>4.193.071</b>	<b>2.238.566</b>		

# Söğüt 5-6 Hekimlik ASM+TSM+112 ASHİ Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi.

İhale Bedeli : 1.527.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Emre KÜNEK-Abdullah  
BARAN İş Ortaklığı  
Sözleşme Tarihi : 22.11.2016  
Yer Teslim Tarihi : 25.11.2016  
İşin süresi : 360 gün  
İşin bitiş tarihi : 20.11.2017  
Fiziki gerçekleştirme : % 100  
Mevcut Durum :Bitti.(Geçici Kabul Sürecinde)



# BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi

Proje Revize işlerine başlandı. Zemin etütleri yapıldı. Uygulama Projeleri firma tarafından hazırlandı. Proje ekibinin kontrolleri beklenmektedir.



ASPLAN  
mimari - mühendislik - danışmanlık



ASPLAN  
mimari - mühendislik - danışmanlık



ASPLAN  
mimari - mühendislik - danışmanlık



# Yenipazar İlçe Entegre Hastanesi Hizmet Binasının Dış Cephe Mantolama Yapım İşi

İhale Bedeli	: 41.000,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Bimaş Bilecik Mermercilik İnş.San.Tic.A.Ş.
Sözleşme Tarihi	: 28.02.2017
Yer Teslim Tarihi	: 01.03.2017
İşin süresi	: 90 gün
İşin bitiş tarihi	: 31.03.2017
Fiziki gerçekleşme	: % 100
Mevcut Durum	: Bitti.




# Bilecik Merkez Sađlıklı Yařam Merkezi Onarım İři

İhale Bedeli : 26.700,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Kuř İnř.İNř.Malz.Nak.Oto  
Tamir Bak.Müh.Dođalgaz Yedek Ltd.řti.  
Sözleşme Tarihi : 08.03.2017  
Yer Teslim Tarihi : 13.03.2017  
İřin süresi :60 gün  
İřin bitiş tarihi : 11.05.2017  
Fiziki gerçekleşme : % 100  
Mevcut Durum : Bitti.



# Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü A ve B Blok Lojmanları Onarım İŖi

İhale Bedeli	: 79.500,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Muzaffer DOĐAN
Sözleşme Tarihi	: 14.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 20.03.2017
İŖin süresi	:75 gün
İŖin bitiş tarihi	: 02.06.2017
Fiziki gerçekleşme	: %100
Mevcut Durum	:Bitti.

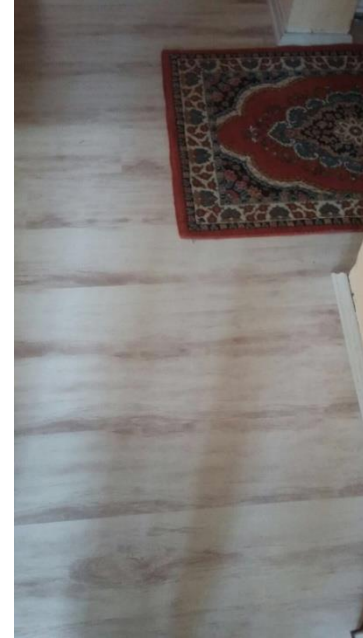



# Bilecik İl Saęlık M¼d¼rl¼ę¼ Ketem Binaları Onarım İŖi

İhale Bedeli	: 108.800,00 TL+KDV
Y¼klenici Firma	: ¼zkan EFECAN
S¼zleŖme Tarihi	: 16.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 17.03.2017
İŖin s¼resi	: 90 g¼n
İŖin bitiŖ tarihi	: 13.06.2017
Fiziki ger¼ekleŖme	: % 100
Mevcut Durum	: Bitti.




# GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	POMEM Müd.GarajTel.Çevre Aydın.veKuru Tip Trafo Yapımı	161.000		160.000	158.991	100%	Bitti.
2	Osmaneli İlçesi Emniyet Müd.Yeni Hiz.Bin.ve Çevre Düz.İşi	1.970.000	947.912	1.964.328	1.964.328	100%	Bitti.
3	Merkez Bölge Trafik Altyapı İşi	125.000		121.304	121.304	100%	Bitti.
4-9	Merkez ve İlçe Emniyet Loj.Onarımı	600.000		598.260	549.787	100%	6 iş bitti.
10-12	Jand.Komt.Bağlı Hiz.Bin.Onarımı	380.000		376.420	376.420	100%	3 iş bitti.
13	Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi	2.260.000	0	2.259.700	912.477	60%	Devam Ediyor
14	Merkez Çarşı Polis Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şb.Md.lüğü Hiz.Bin.	2.465.000	1.378.675	2.460.885	2.391.920	99%	Devam Ediyor
15	Mrk.İl Jan.Tug.Kom.Enerj.Altıapı İşi	6.315.000		6.313.000	2.674.026	99%	Devam Ediyor
16	2.Jandarma tugay kom.lığı hizmet binası tadilat işi			1.000.000			Proje çalışması dev.ed.
<b>16</b>	<b>GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>14.276.000</b>	<b>2.326.587</b>	<b>15.253.897</b>	<b>9.149.253</b>		

# Osmaneli İlçesi Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale Bedeli : 2.468.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Hanet İnş.San.ve  
Tic.Ltd.Şti. Tekin TANIŞ İş Ortaklığı  
Sözleşme Tarihi : 06.05.2016  
Yer Teslim Tarihi : 11.05.2016  
İşin süresi : 420 gün  
İşin bitiş tarihi : 05.07.2017  
Fiziki gerçekleşme : % 100  
Mevcut durum : Bitti.

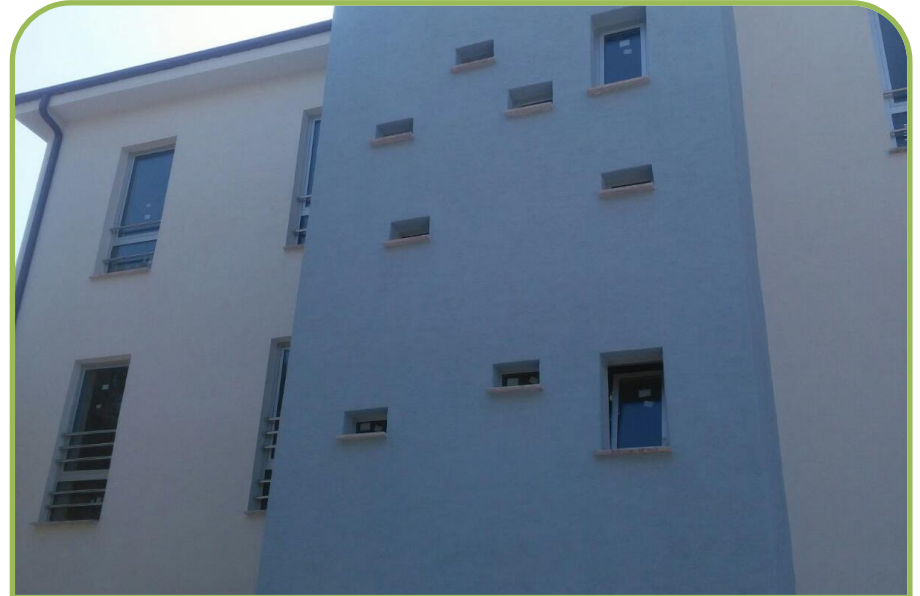

# Bilecik Merkez Çarşı Polis Merkez Amirliđi ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü Hizmet Binası

İhale Bedeli	: 3.042.000,00 TL+KDV
Yüklenici Firma	: Mehmet Kızıl
Sözleşme Tarihi	: 12.02.2016
Yer Teslim Tarihi	: 16.02.2016
İşin süresi	: 700 gün
İşin bitiş tarihi	: 15.01.2018
Fiziki gerçekleşme	: % 99
Mevcut durum	: Devam Ediyor.



# Bilecik İli Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 1.915.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Gençbilaloğlu İnş.Gıd.Mad.  
Tekstil Orman Ürünleri Tic.Ltd.Şti.  
Sözleşme Tarihi : 18.05.2017  
Yer Teslim Tarihi : 22.05.2017  
İşin süresi : 400 gün  
İşin bitiş tarihi : 26.06.2018  
Fiziki gerçekleşme : %60  
Mevcut durum : Devam Ediyor.



# Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Elektrik Havai Hattı Yeraltına Alınması İşi

İhale Bedeli : 5.350.000,00 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Bilçelik Elektrik İnş.Turz.San. Ve Tic.Ltd.Şti.  
Sözleşme Tarihi : 21.06.2017  
Yer Teslim Tarihi : 23.06.2017  
İşin süresi : 365gün  
İşin bitiş tarihi : 22.06.2018  
Fiziki gerçekleşme : %99  
Mevcut Durum :Devam Ediyor.




# KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi Güçlendirme Projesi	28.261		28.261	28.261	100%	Bitti.
2	Gölpazarı İlçe Halk Kütüphanesi Güçlendirme ve Onarım	348.141		348.141	348.141	100%	Bitti.
3	Söğüt Şenlik alanı tribün üstü kapatma işi	2.174.577		2.174.577	442.229	100%	Bitti.
4	Hükümet Konağı Restorasyon Yap.İşi	3.633.951		3.633.951	577.659	20%	Devam Ediyor.
5	Söğüt Borçak köyü İsa Sofu Türbesi Restorasyon ve Onarım işi	181.130		181.130	91.588	51%	Devam Ediyor.
6	Demirköy Geleneksel Kültür ve El Sanatları Merkezi						Kültür Bak.Ödenek Tal.Yap.
	Söğüt Geleneksel Kültür ve El Sanatları Merkezi						Kültür Bak. Ödenek Tal.Yap.
	Söğüt pilav pişirme yeri						Proje çalışması dev.ed.
<b>6</b>	<b>KÜLTÜR VE TURİZM TOPLAMI</b>	<b>6.366.060</b>		<b>6.366.060</b>	<b>1.487.878</b>		

# Hükümet Konağı Restorasyon Yapım İşi

İhale Bedeli : 3.079.620,13 TL+KDV  
Yüklenici Firma : Emine Yavuz-Yavuz  
Mimarlık-  
Sözleşme Tarihi : 07.03.2017  
Yer Teslim Tarihi : 13.03.2017  
İşin süresi : 600 gün  
İşin bitiş tarihi : 03.11.2018  
Fiziki gerçekleşme : % 20  
Mevcut Durum : Devam Ediyor.

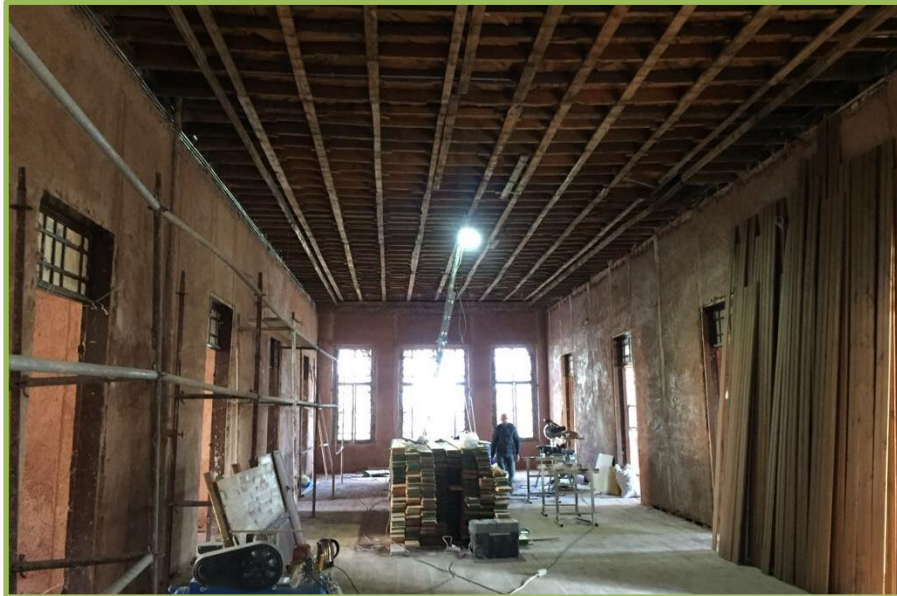




# Söğüt Borçak Köyü İsa Sofu Türbesi Restorasyon ve Onarım işi

İhale Bedeli : 181.130,00 TL  
Yüklenici Firma : Emine YAVUZ  
Sözleşme Tarihi : 22.05.2017  
Yer Teslim Tarihi : 26.05.2017  
İşin süresi : 120 Gün  
İşin bitiş tarihi :  
Fiziki gerçekleşme : %51  
Mevcut durum : Devam Ediyor.



# Söğüt Şenlik alanı tribün üstü kapatma işi

İhale Bedeli	: 1.842.862 + KDV
Yüklenici Firma	: TENSA FORM
Sözleşme Tarihi	: 29.06.2017
Yer Teslim Tarihi	: 29.06.2017
İşin süresi	: 60 Gün
İşin bitiş tarihi	: 29.08.2017
Fiziki gerçekleşme	: %100
Mevcut durum	: Bitti.

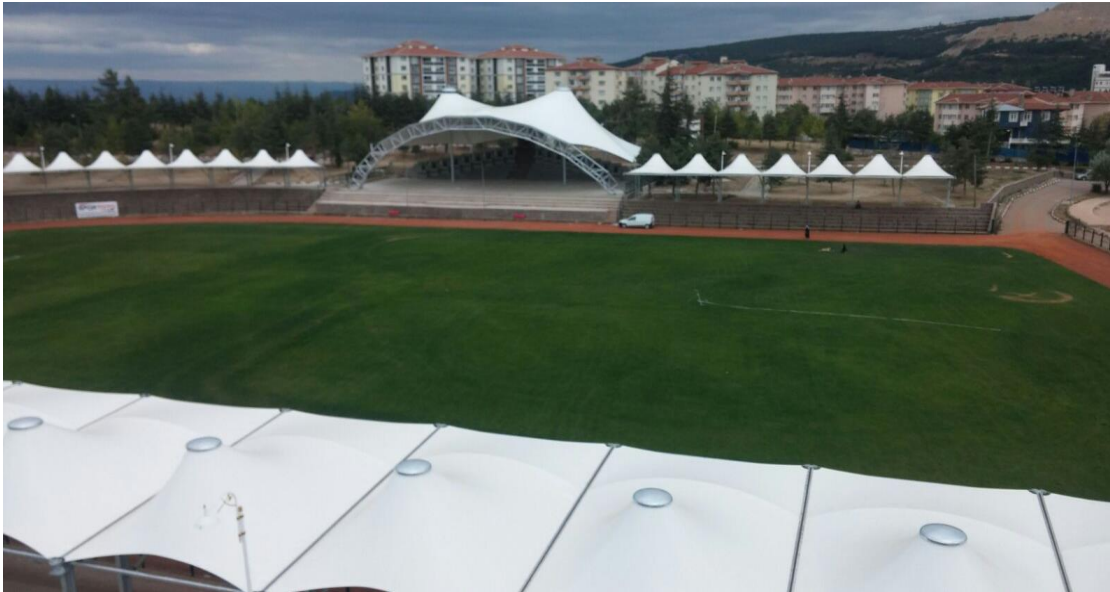

# Bilecik Gölpazarı İlçe Halk Kütüphanesi Güçlendirme ve Onr. Ve Eng.Bil.Yapım İŖi.

İhale Bedeli : 299.900,00 TL+KDV

Yüklenici Firma : Gökdemir Asf Nak.İnŖ.Taah. Turz. Paz.San.Tic.Ltd.Ŗti.

Sözleşme Tarihi : 11.10.2016

Yer Teslim Tarihi : 17.10.2016

İŖin süresi : 180 gün

İŖin bitiş tarihi :14.04.2017

Fiziki gerçekleşme : % 100

Mevcut durum :Bitti.



# TESİS BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR		PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Gayrimenkul Mal Bakım ve On. (Hizmet Binaları)	270.000		267.683	267.683	100%	Bitti.
2	İl özel İdaresi İdari Hiz.ve Lojman Binaları Bakım ve Onarım İşi	215.000		232.802	232.802	100%	Bitti.
3	Söğüt Çaltı köyü Hamambaşı mevkii kafeterya yapım işi	160.000		156.527	156.527	100%	Bitti.
4	Söğüt Hükümet Konağı Onarımı	100.000		94.164	85.229	100%	Bitti.
<b>4</b>	<b>TESİS BAKIM ONARIM TOPLAMI</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>751.176</b>	<b>742.241</b>		

## SOSYAL HİZMETLER

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Semt Sahaları Bakım ve Onarımı	10.000	10.000	10.000	%100	Bitti.(Edebali Stadı Onarımı)
<b>1</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**ÇEVRE KORUMA ve  
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

# ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Jeotermal Sahaları Mineralli Sular ve Çevre Düzenlemesi	10.000		10.000	9.971	100%	Bitti.(Parke Taşı)
2	Çocuk Oyun Grubu	75.000		75.000	74.998	100%	Bitti.(11 Köy)
3	Aksutekke Köyü Mesire Alanı	75.000		75.000	75.000	100%	KHGB'ne Aktarıldı.
4	Çevre Temizlik Hizmet Alımı	75.000		75.000	68.605	100%	Bitti.(171 Ad.Konteynır)
5	Harmankaya Kanyonu	46.000		45.763	45.048	100%	Bitti. (Taş duvar ve isale hattı onarımı)
6	Çevrenin Temiz Tutulması	55.000		50.880			
	<b>ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>336.000</b>		<b>331.643</b>	<b>273.622</b>		



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ**

# KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Mal.Yardıımı	85.000		85.000	44.166	100%	Bitti.
2	Tanıtım, Fuar Organizasyon Prj.	40.000		40.000	30.522	100%	Bitti.
3	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	21.000		21.000	19.729	100%	Bitti.
4	El Sanatları Geliştirme Projesi	10.000		10.000			Devam Ediyor.
<b>4</b>	<b>KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>156.000</b>		<b>156.000</b>	<b>94.417</b>		



**2017 YILI**  
**KÖYDES PROJELERİ UYGULAMALARI**

**( 31.12.2017 Tarihi İtibariyle )**

# BİLECİK İLİNE YILLAR İTİBARIYLA TAHSİS EDİLEN KÖYDES ÖDENEKLERİ İCMALİ

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK	YILLAR													TOPLAM
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
KÖY YOLLARI	508.000	11.330.750	10.625.000	2.076.976	1.333.351	1.378.338	3.232.105	2.580.000	4.056.000	2.471.631	2.444.603	2.477.747	8.567.533	53.082.034
İÇME SULARI	315.000	1.085.000	1.230.000	1.313.024	1.209.649	1.211.714	1.181.000	820.000	1.574.503	1.438.087	1.594.337	1.727.123		14.699.437
KANALİZASYON		273.250												273.250
SULAMA		701.000				1.368.674	1.405.000	100.000	26.497			145.606		3.746.777
ORTAK ALIM									30.000					30.000
SAYISAL HARİTA						175.000	125.000							300.000
YÖNETİM GİDERLERİ											45.782	12.000		57.782
<b>TOPLAM</b>	<b>823.000</b>	<b>13.390.000</b>	<b>11.855.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>4.133.726</b>	<b>5.943.105</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.687.000</b>	<b>3.909.718</b>	<b>4.084.722</b>	<b>4.362.476</b>	<b>8.567.533</b>	<b>72.189.280</b>

# KÖYYOLLARI UYGULAMALARI

İLÇE ADI	2017 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA (Km)				Biten	Devam Eden	Başlamayan	TOPLAM	AÇIKLAMALAR
					BSK	SATHİ KAPLAMA	ONARIM	STABİLİZE					
MERKEZ	1.677.728		1.677.728	1.101.982	4,20				1		1	2	1-Deresakarı-Gölpazarı Hd.Bitti. 2-Beyce-Cumalı-Osmaneli Hd.Başlamadı.
BOZÜYÜK	1.109.943		1.109.943	1.109.943	9,20		17,00		2			2	1-Kandilli(Eskişehir Hd) Bitti. 2-Cihangazi-Karaçayır-Osmaniye-Gökçeli Bitti.
GÖLPAZARI	1.734.507		1.734.507	1.734.507	3,80	8,00	4,00	4,00	2			2	1-Karaahmetler-Sarıhacılar Bitti. 2-Çengeller-Bayat-Kasımlar Bitti.
İNHİSAR	427.361	90.226	517.587	0						2		2	1-Çayköy-Akköy-Harmanköy 2-Samrı(Söğüt Hd)Devam Ediyor.
OSMANELİ	1.204.231		1.204.231	1.204.231	3,00		5,00		2			2	1-Osmaneli-Soğucakpınar-Gölpazarı Hd. Bitti. 2-Düzmeşe-Çiftlik-Avdan Bitti.
PAZARYERİ	799.204	411.377	1.210.581	1.210.581	11,00				2			2	1-Bozcaarmut Bitti. 2-Küçükelmalı-Güde Bitti.
SÖĞÜT	961.516		961.516	961.516	17,50				1			1	1-Küre-Hamitabat-Tuzaklı-Kayabalı-Gölpazarı Hd. Bitti.
YENİPAZAR	653.043		653.043	653.043	3,00	2,20	2,20	2,20	2			2	1-Kuşça Bitti. 2-Selim-Katran-Yukarıboğaz-Kükürt-Ulucak Bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>8.567.533</b>	<b>501.603</b>	<b>9.069.136</b>	<b>7.975.803</b>	<b>51,70</b>	<b>10,20</b>	<b>28,20</b>	<b>6,20</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	

## İÇMESULARI UYGULAMALARI

İLÇE ADI	2017 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	PROGRAM DURUMU			UYGULAMA DURUMU			AÇIKLAMALAR
					SENE BAŞI PLANLANAN	EK PROGRAM	TOPLAM	BİTEN	DEVAM EDEN	TOPLAM	
GÖLPAZARI		114.7199	<b>114.719</b>	<b>114.719</b>		1	<b>1</b>	1		<b>1</b>	(Klorlama Cihazı) Sarıhacılar, Hamidiye Köyleri, Kümbet-Dumanlar, Çımışk-ı-Bahçelievler Mahalleleri
İNHİSAR		14.279	<b>14.279</b>	<b>14.279</b>		1	<b>1</b>	1		<b>1</b>	(Klorlama Cihazı) Akköy, Koyunlu Köyleri
PAZARYERİ		63.275	<b>63.275</b>	<b>61.105</b>		1	<b>1</b>	1		<b>1</b>	Dülgeroğlu Köyü Depo Onarımı
<b>TOPLAM</b>		<b>192.273</b>	<b>192.273</b>	<b>190.103</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	
